Planning dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster

GEMEENTE BEEMSTER WERELDERFGOED

Datum: 8-5-19

De planning is gebaseerd op een globale inschatting van activiteiten en doorlooptijden. Derhalve kunnen aan deze planning geen rechten worden ontleend.
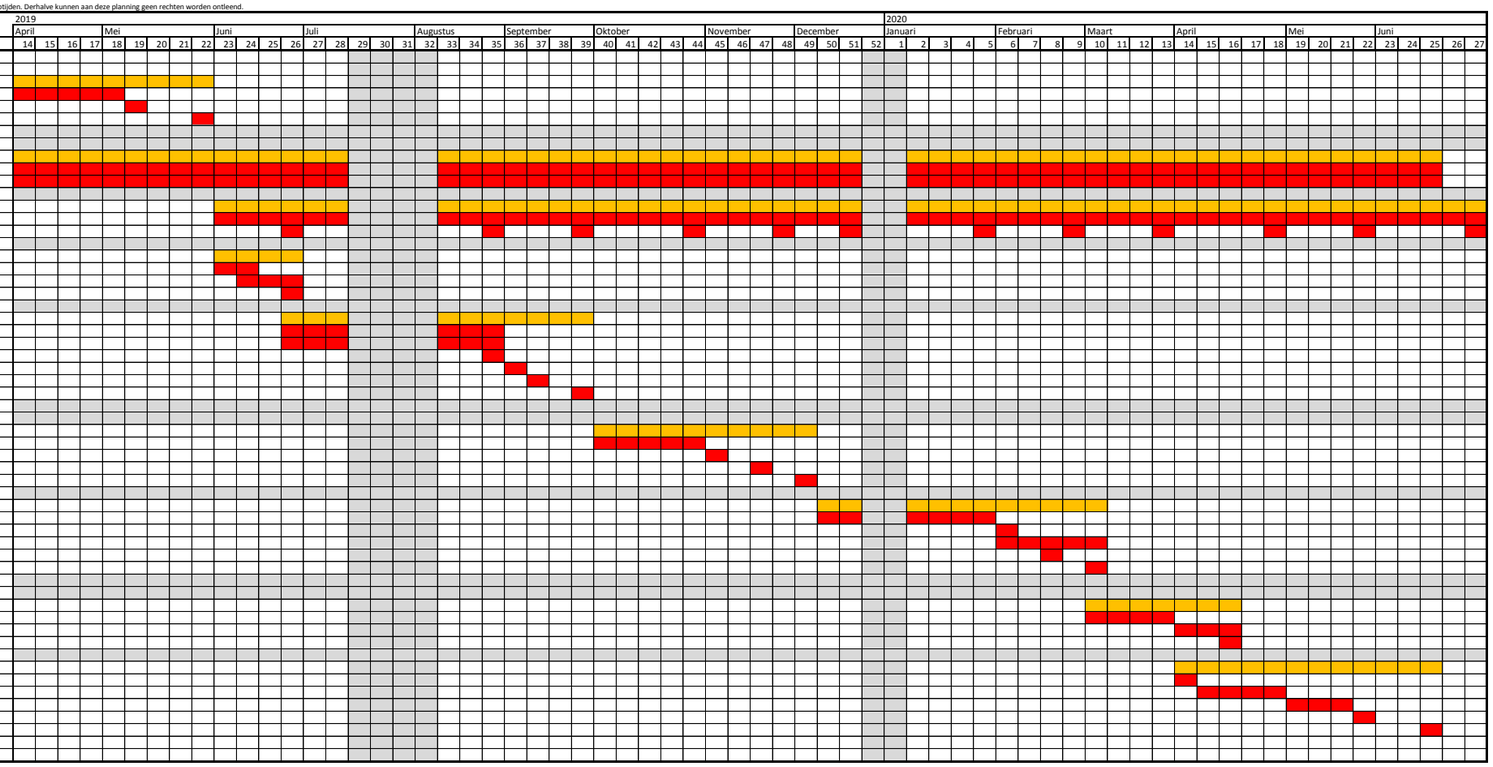
Actie:	Wie:
FASE 1: VERKENNING	
Project PvA opstellen	
-Bepalen projectdoelstelling, -activiteiten, -producten, -organisatie, -planning, -kosten & baten en risico`s	Projectteam
-Besluit B&W op PvA	B&W
-PvA incl. kredietbeschikking ter besluitvorming in raad (28-5-19, raadsCIE + gemeenteraad)	Raad
FASE 2: HAALBAARHEID	
Stakeholdersanalyse	
-In kaart brengen stakeholders en hun belangen	Projectteam
-Gesprekken met belanghebbenden	Projectteam + derden
Opzetten website en externe communicatie	
-Voorbereiden en onderhouden website, incl. ideeënbus, waar benodigde info en stavaza over project kan worden gevonden	Projectteam
-Uitgeven maandelijkse nieuwsbrief	Projectteam
Selecteren stedenbouwkundig bureau en een strategisch communicatieadviseur	
-Onderzoeken juridische (on)mogelijkheden onderhandse enkelvoudige selectie	Projectteam
-Afstemming opdrachtvoorwaarden	Projectteam
-Gunning	Projectteam
Nota van Uitgangspunten	
-Intern bepalen 0-situatie en kaders voor het dorpsontwikkelingsplan	Projectteam + stedenbouwkundig bureau
-Belanghebbenden kunnen onderwerpen via website aandragen	Derden
-Opstellen raadsvoorstel	Projectteam
-Besluit B&W op raadsvoorstel	B&W
-Toelichten NvU aan raad in informatieavond (10-9-19)	Projectteam + B&W + raad
-Behandeling raad (24-9-19, raadsCIE + gemeenteraad)	Raad
FASE 3: ONTWERP	
Participatiebijeenkomsten met belanghebbenden organiseren	
-Voorbereiden participatiebijeenkomsten (opstellen format, input, uitnodigingen, overleg sessiebegeleider, verslaglegging, etc.)	Projectteam + stedenbouwkundig bureau
-Integraal (op dorpsniveau) participatiebijeenkomst 1	Projectteam + stedenbouwkundig bureau + raad + derden
-Integraal (op dorpsniveau) participatiebijeenkomst 2	Projectteam + stedenbouwkundig bureau + raad + derden
-Integraal (op dorpsniveau) participatiebijeenkomst 3	Projectteam + stedenbouwkundig bureau + raad + derden
Opstellen (ontwikkelings)scenario`s	
-Opstellen scenario`s a.d.h.v. output participatiebijeenkomsten en Nota van Uitgangspunten	Stedenbouwkundig bureau
-Scenario`s ter besluitvorming bij B&W bespreken (kunnen de uitgewerkte scenario`s "naar buiten" worden gebracht?)	Projectteam + B&W
-Scenario`s ter consultatie op website + inloop voor vragen + informatieverstrekking naar belanghebbenden	Projectteam + stedenbouwkundig bureau + derden
-Toelichten scenario`s aan raad in infoavond	Projectteam + stedenbouwkundig bureau + B&W + raad
-(Voorkeur)scenario`s ter afweging (niet besluitvormend) met Raad bespreken (maart 2020, raadsCIE)	B&W + raad
FASE 4: UITVOERING	
Opstellen dorpsontwikkelingsvisie	
-Voorkeurscenario uitwerken in concept dorpsontwikkelingsvisie + voorbereiden besluit B&W	Stedenbouwkundig bureau
-Bespreken met stakeholders	Projectteam
-Openbare informatie avond organiseren	Projectteam + stedenbouwkundig bureau
Procedure dorpsontwikkelingsvisie	
-Besluit B&W in procedure brengen concept dorpsontwikkelingsvisie	B&W
-Inspraaktermijn concept dorpsontwikkelingsvisie (4 weken)	N.v.t.
-Beoordelen inspraakreacties + voorbereiden raadsbesluit	Projectteam
-Besluit B&W op raadsvoorstel	B&W
-Vaststelling dorpsontwikkelingsvisie door raad (juni 2020, raadsCIE + gemeenteraad)	Raad
